



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Zakończenie realizacji I Etapu „Programu Żuławskiego – 2030” Projekty 2007-2015

Bartłomiej Maliszewski

Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

08.12.2015 r., Gdańsk





INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekty związane z ochroną przeciwpowodziową, a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, są obecnie realizowane w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”.





Priorytet III PO IiŚ obejmuje następujące działania:

Działanie 3.1.: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Działanie 3.2.: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

Działanie 3.3.: Monitoring Środowiska

**Za wdrożenie projektów III Priorytetu PO IiŚ odpowiada
Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami
NFOŚiGW.**





ZADANIA

Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami

- Monitorowanie przygotowania aplikacji
- Koordynowanie i prowadzenie oceny wniosków
- Uzgadnianie warunków dofinansowania i ich zmiany
- Wspieranie realizacji projektów
- Rozliczanie





Projekty realizowane w ramach Priorytetu III PO IiŚ

POSTĘPY					
Rok	Liczba Umów (narastająco)	Dofinansowanie pierwotne	Dofinansowanie (narastająco)	Dofinansowanie aktualna wartość	Dofinansowanie (narastająco)
2008	1	44 293 160,00 zł	44 293 160,00 zł	38 571 722,70 zł	38 571 722,70 zł
2009	2	24 437 499,15 zł	68 730 659,15 zł	94 899 531,16 zł	133 471 253,86 zł
2010	9	300 108 897,31 zł	368 839 556,46 zł	459 372 497,58 zł	592 843 751,44 zł
2011	17	611 284 483,24 zł	980 124 039,70 zł	601 780 657,02 zł	1 194 624 408,46 zł
2012	23	1 133 221 353,12 zł	2 113 345 392,82 zł	1 196 699 630,63 zł	2 391 324 039,09 zł
2013	24	36 466 697,80 zł	2 149 812 090,62 zł	15 221 384,67 zł	2 406 545 423,76 zł
2014	25	169 933 961,58 zł	2 319 746 052,20 zł	168 757 250,15 zł	2 575 302 673,91 zł





Projekty „Programu Żuławskiego” w ramach Priorytetu III PO IiŚ

LP	Tytuł projektu	Data podpisania Umowy	Koszt całkowity projektu (wk + wnk)		Wydatki kwalifikowane		Wartość dofinansowania UE	
			wartość pierwotna	wartość aktualna	wartość pierwotna	Wartość aktualna	wartość pierwotna	wartość aktualna
1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Miasto Elbląg	2011-07-20	42 320 000,00	40 082 138,45	42 320 000,00	40 082 138,45	35 972 000,00	34 049 481,68
2	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Miasto Gdańsk	2011-07-20	154 559 725,66	137 139 033,26	154 351 029,99	137 022 655,34	131 198 375,49	116 469 256,89
3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011-11-10	189 865 557,08	139 981 321,10	186 794 975,43	138 231 810,10	158 775 729,11	117 497 038,58
4	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	2011-12-16	99 840 000,00	86 458 077,27	99 840 000,00	86 030 916,07	84 860 000,00	73 122 831,91
5	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - ŻZMiUW w Elblągu	2012-07-10	93 710 683,93	61 320 474,67	91 828 953,50	59 003 405,24	78 054 610,47	50 152 894,45
6	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański	2012-07-19	28 325 777,29	36 554 503,66	28 325 777,29	36 550 211,95	24 076 910,69	31 067 680,15
SUMA			608 621 743,96	501 535 548,41	603 460 736,21	496 921 137,15	512 937 625,76	422 359 183,66





Projekty „Programu Żuławskiego” w ramach Priorytetu III PO IiŚ

LP	Tytuł projektu	Data podpisania Umowy	Koszt całkowity projektu (wk + wnk)		Wydatki kwalifikowane		Wartość dofinansowania UE	
			wartość pierwotna	wartość aktualna	wartość pierwotna	Wartość aktualna	wartość pierwotna	wartość aktualna
1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Miasto Elbląg	2011-07-20	42 320 000,00	40 082 138,45	42 320 000,00	40 082 138,45	35 972 000,00	34 049 481,68
2	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Miasto Gdańsk	2011-07-20	154 559 725,66	137 139 033,26	154 351 029,99	137 022 655,34	131 198 375,49	116 469 256,89
3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2011-11-10	189 865 557,08	139 981 321,10	186 794 975,43	138 231 810,10	158 775 729,11	117 497 038,58
4	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	2011-12-16	99 840 000,00	86 458 077,27	99 840 000,00	86 030 916,07	84 860 000,00	73 122 831,91
5	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - ŻZMiUW w Elblągu	2012-07-10	93 710 683,93	61 320 474,67	91 828 953,50	59 003 405,24	78 054 610,47	50 152 894,45
6	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański	2012-07-19	28 325 777,29	36 554 503,66	28 325 777,29	36 550 211,95	24 076 910,69	31 067 680,15
SUMA			608 621 743,96	501 535 548,41	603 460 736,21	496 921 137,15	512 937 625,76	422 359 183,66





DROGA DO REALIZACJI



- powierzenie NFOŚiGW funkcji IW dla III osi POIiŚ
- powstaje Departament Wdrażania III osi POIiŚ (DW)
- wpis na Listę Projektów Indywidualnych
- złożenie wniosku o dofinansowanie
- zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie
- potwierdzenie IP
- zawarcie umowy o dofinansowanie





ROZWÓJ PROJEKTU

30.01.2009 r.
umieszczenie
projektu na LPI

26.01.2010 r.
podpisanie pre-
Umowy

01.12.2011 r.
wniosek o
dofinansowanie

16.12.2011 r.
Umowa o
dofinansowanie

14.03.2012 r.
złożenie
pierwszego
WoP

16.08.2012 r.
certyfikacja
pierwszego
WoP


- Liczba złożonych wniosków o płatność - 16
- Łączna kwota wydatków kwalifikowanych – 79 075 281,24 zł






ROZWÓJ PROJEKTU

Terminy zatwierdzania wniosków o płatność

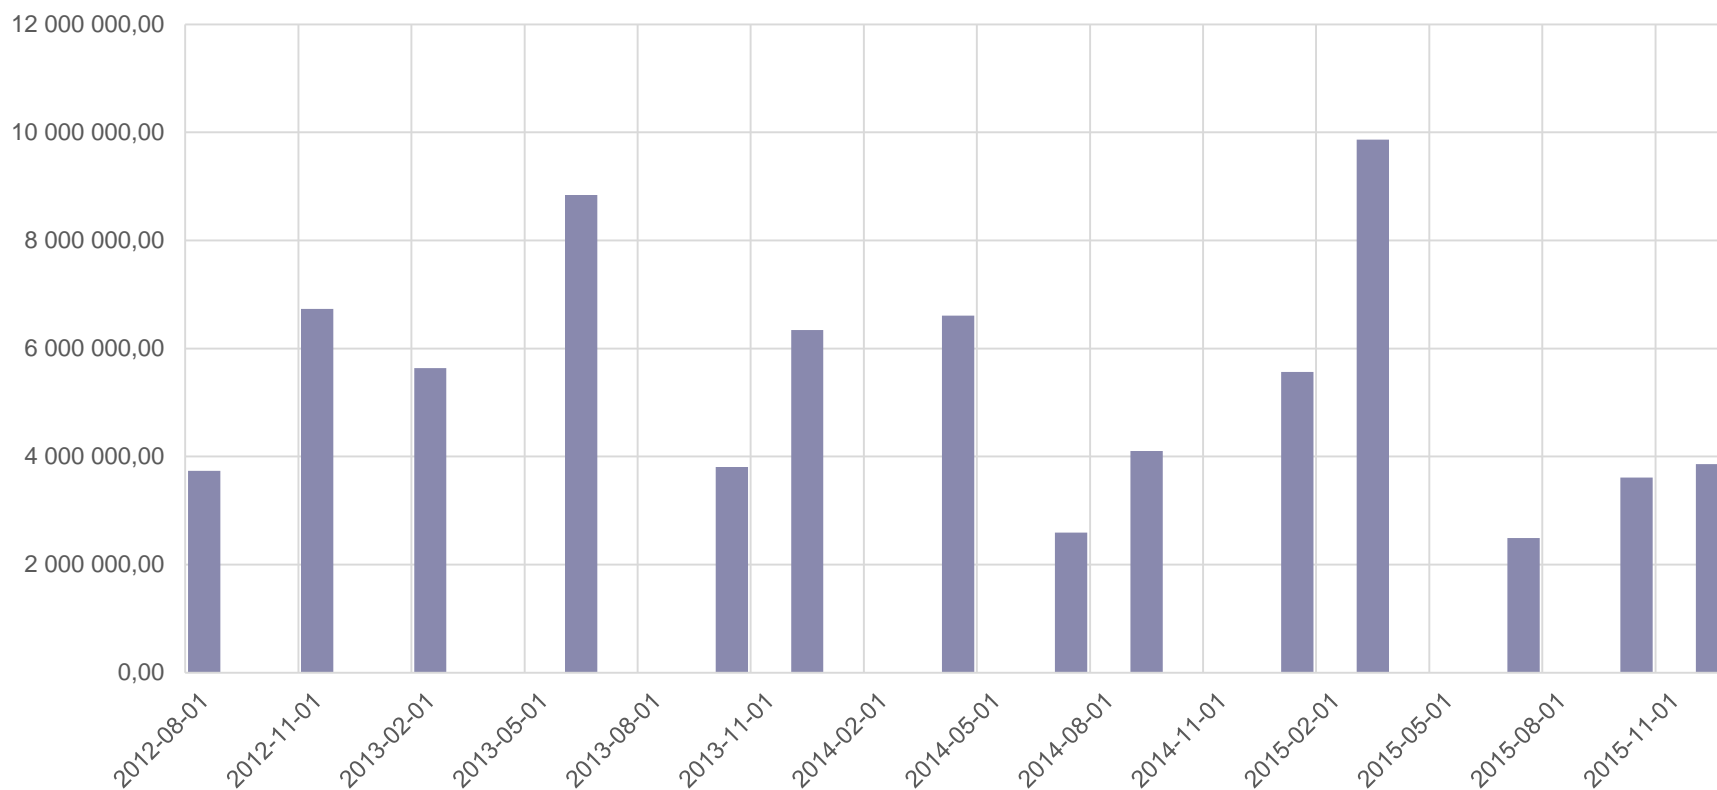



Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane dla Projektów Programu Żuławskiego

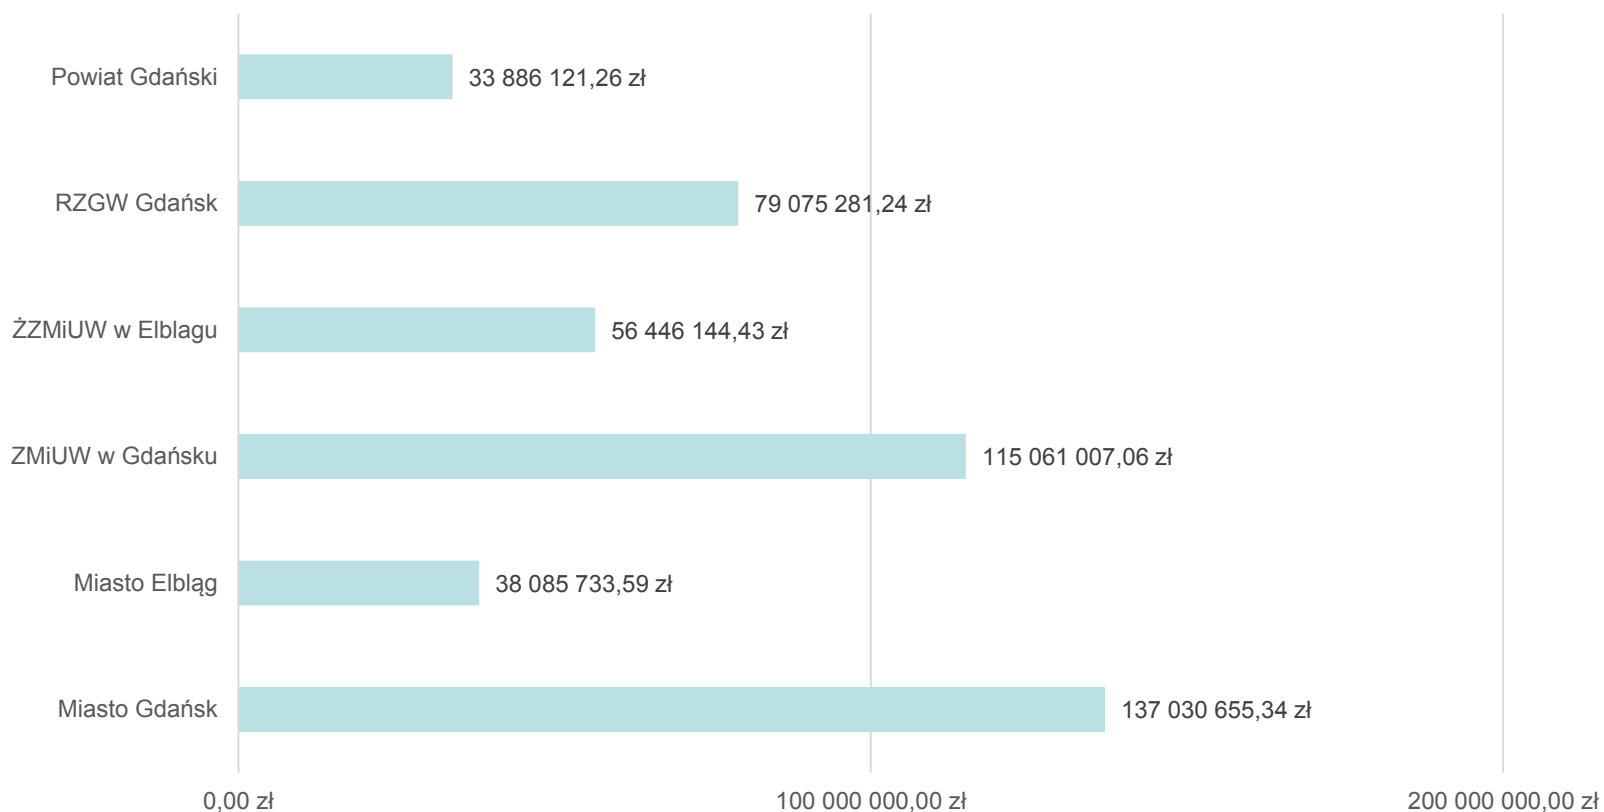



Aneks 1
2013-07-10

- Rozszerzenie zakresu projektu o zadanie dotyczące „Odbudowy ostróg na rzece Wiśle. Gmina Stegna. Zwolnienie oszczędności.
- Wartość kosztów kwalifikowanych: **82 776 920,77 zł.**

Aneks 2
2014-06-17

- Rozszerzenie zakresu projektu o zadanie dotyczące SMO RP. Zwolnienie oszczędności. Wydłużenie realizacji projektu do 31.10.2015 r.
- Wartość kosztów kwalifikowanych: **82 756 947,82 zł.**

Aneks 3
2014-09-26

- Rozszerzenie zakresu projektu o zakup sprzętu służącego utrzymaniu trwałości Projektu. Wzrost wartości kontraktu dotyczącego przebudowy ujścia Wisły. Wzrost wartości projektu. Wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2015 r.
- Wartość kosztów kwalifikowanych: **86 109 413,73 zł.**

Aneks 4
2015-09-29

- Zwolnienie oszczędności/rezerwy inwestycyjnej powstałej na Projekcie.
- Wartość kosztów kwalifikowanych: **86 030 916,07 zł.**

Aneks 5

- Zwolnienie oszczędności/rezerwy inwestycyjnej powstałej na Projekcie.
- Wartość kosztów kwalifikowanych: **85 403 340,54 zł.**





INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Dziękuję za uwagę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa**

www.nfosigw.gov.pl

e-mail:

bartlomiej.maliszewski@nfosigw.gov.pl

